

# M2 TIW - Module Projet

Etude de cas Vive l'Avion – Exemple de support de comité de pilotage

---

DANIELA TSAMALAX MOKELO

# AGENDA

---

Situation du projet

Planning

Budget

Risques

# SITUATION DU PROJET



Élément	Météo	Tendance	
Alimentation équipe réalisation	☹️	↑	Risque de rupture de charge
Avancement réalisation	😊	↑	Avancement nominal
Avancement recette métier	😞	➔	Retard à 3 semaines de la MEP
Budget	☹️	➔	Pas de dépassement
Moral équipe	😊	↑	Reprise de confiance suite à formation SQL
Satisfaction client	😊	➔	Bon retours métiers suite à livraison

## Avancement

- 04/10/2017 : Fin sprint 4
- 05/10/2017: Démarrage sprint 5

## Recette

Bloquant	Majeurs	Mineurs	Clos
0	12	36	22

## Faits marquants

- Planning : étirement du planning → ajout sprints 6 et 7
- Augmentation de périmètre
- Réévaluation budgétaire : **750 000€**


## Risques

Description	Criticité
Recette métier non démarrée	Haute
Disponibilité des environnements (INT, PROD)	Haute
Tests de performance interviennent en fin de réalisation	Haute

## Avancement réalisation

	SFD	Dev IHM	Dev Import	Qualif	Recette
Menu	100%	100%	100%	100%	100%
Analyse conflit	100%	100%	100%	100%	100%
Suivi ambiance	100%	100%	100%	100%	100%
Archivage	75%	80%	N/A	30%	0%
Tableaux de bo	60%	60%	N/A	0%	0%
Référentiels	50%	100%	50%	50%	0%
Exports	100%	100%	100%	100%	100%


# Dispositif projet

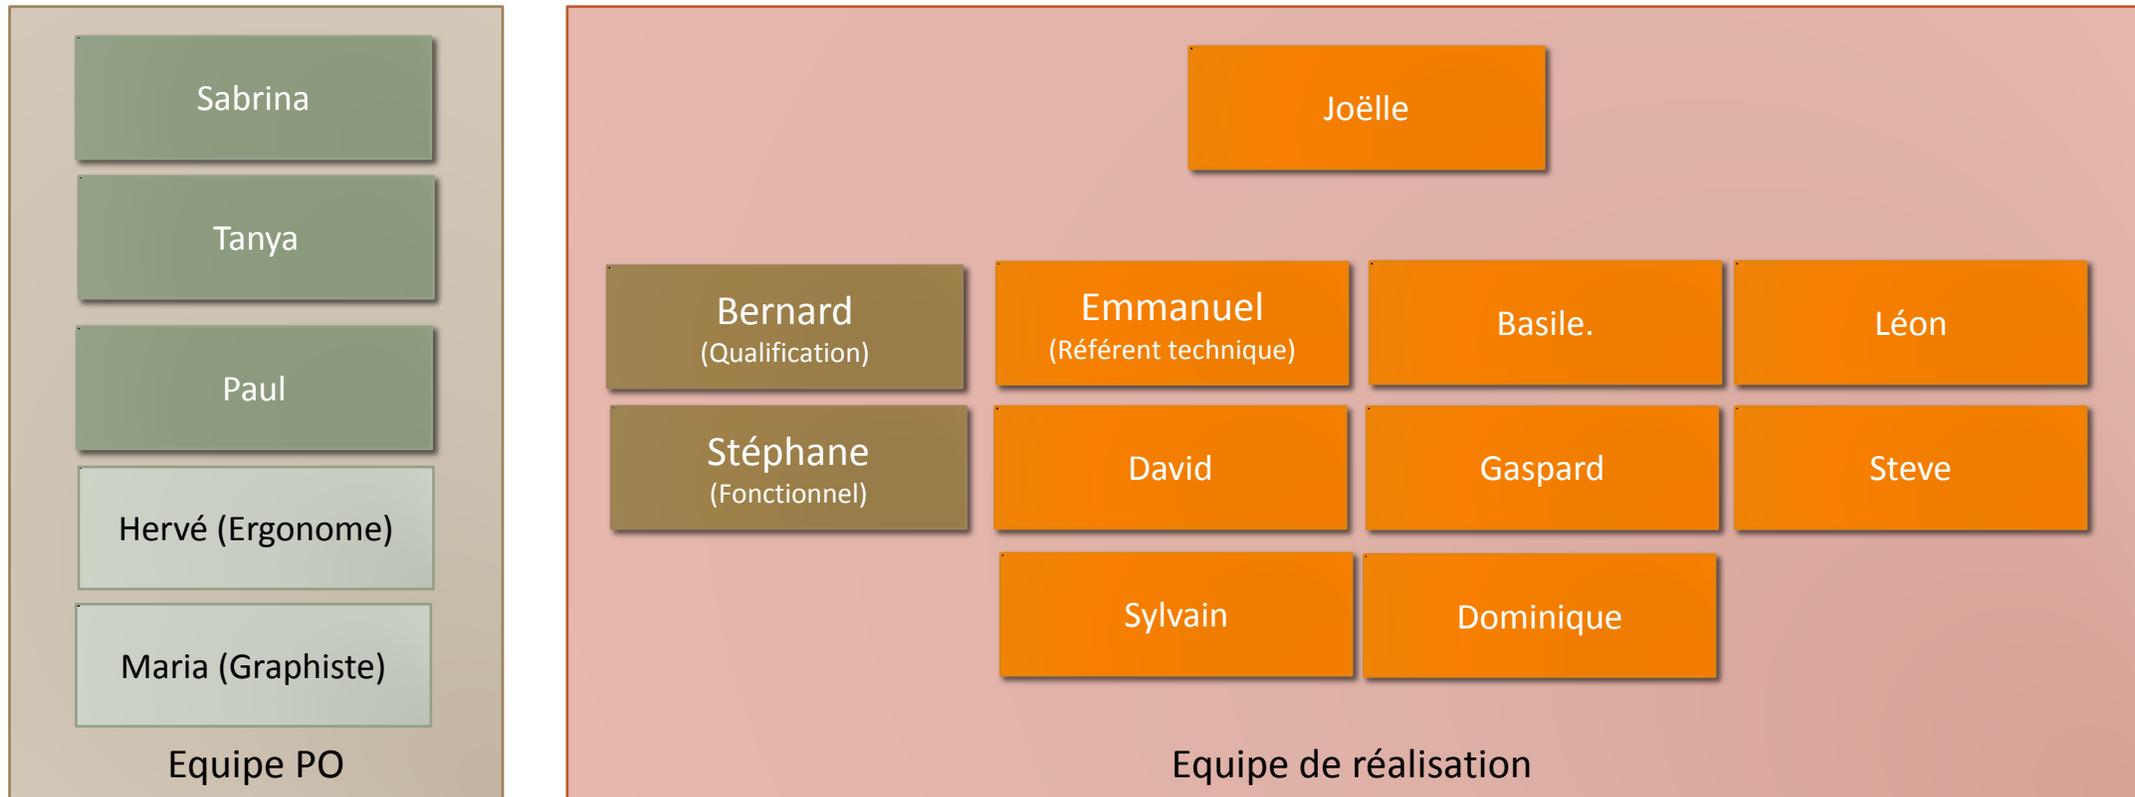

- Entrées : 2 Développeurs
- Sorties fin avril : Ergonome

1 ETP pour traiter les retours de recette

# Planning actualisé

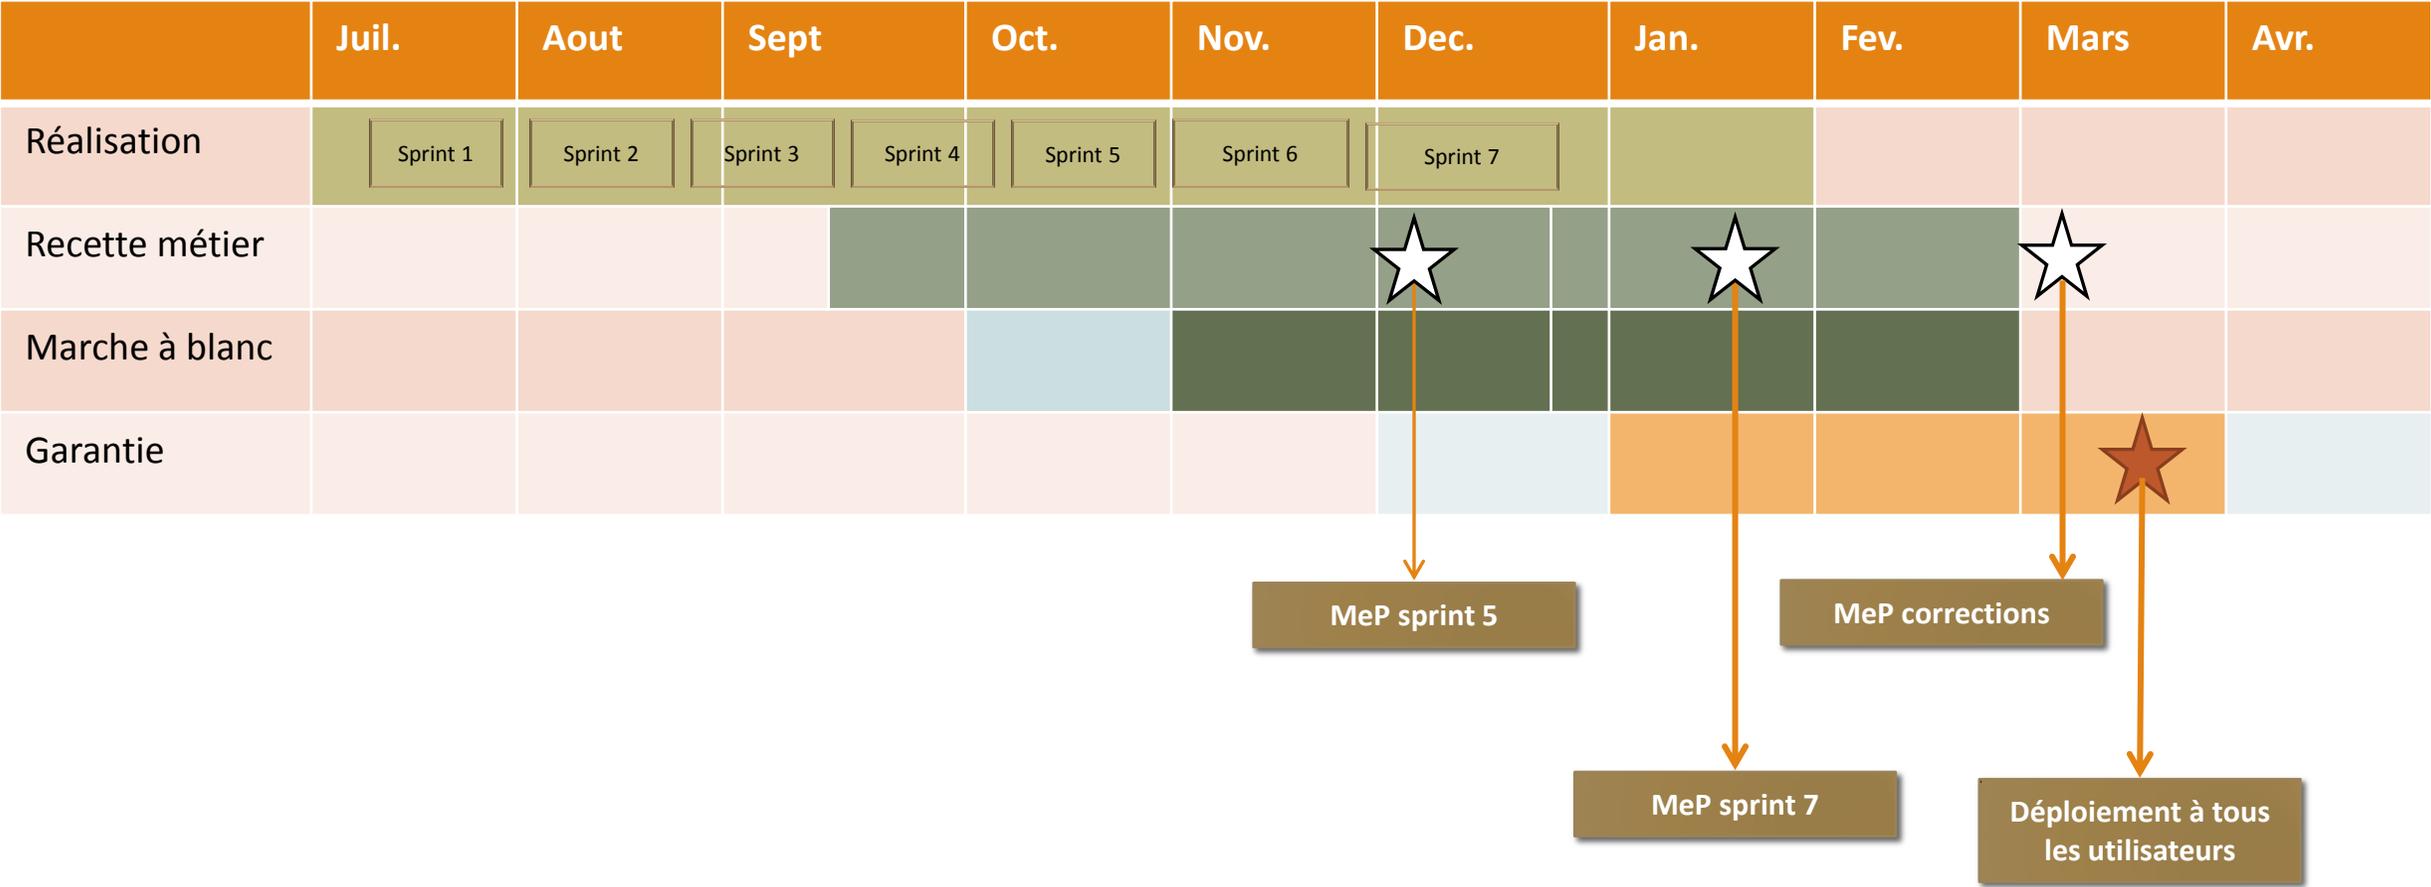

# BUDGET

## Suivi de la facturation

---

	Montant total	Déjà facturé	Facturation Juin 2016	Reste à facturer
Réalisation Logiciel	750 000 € Dont budget initial: 700 000€ Dont avenant:50 000€	450 000€	100 000€	200 000 €
Avenant Reprise de données	25 000 €	12 500€	0€	12 500 €
Avenant Tests de performance	35 000 €	10 000€	15 000€	10 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>810 000 €</b>	<b>472 500 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>222 500 €</b>

# Risques

---

Type	Description	Criticité	Impact	Actions	Porteur Action	Statut risque
Projet	Plateformes d'intégration et de pré-production non disponibles	Haute	Mise en production impossible	Finaliser DAT Commander environnements	Sabrina Joëlle	Ouvert

---

EASYSOFT

12 COURS DE LA LIBERTÉ

12345 THIERS

TEL: 01.23.45.67.89
